


PROJECTE D'IMPLEMENTACIÓ D'UNA APLICACIÓ WEB DINÀMICA I ANÀLISI DE POSICIONAMENT SEO

Ismael E. Abadur Jordà

INTRODUCCIÓ

El projecte consta de dues parts diferenciades:

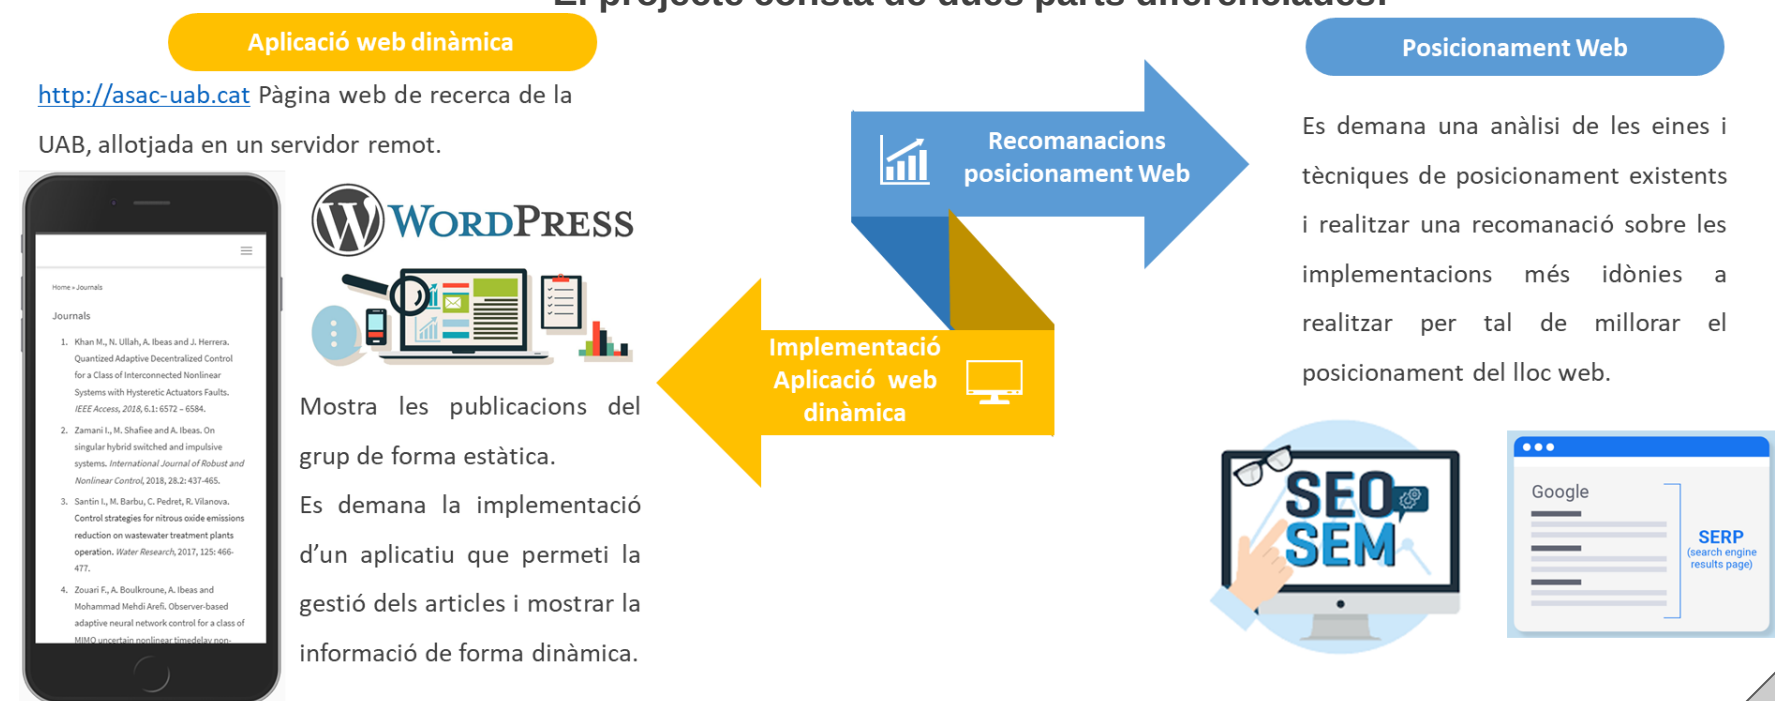


EMPRESA I TECNOLOGIA


UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

2018-2019

ABAST

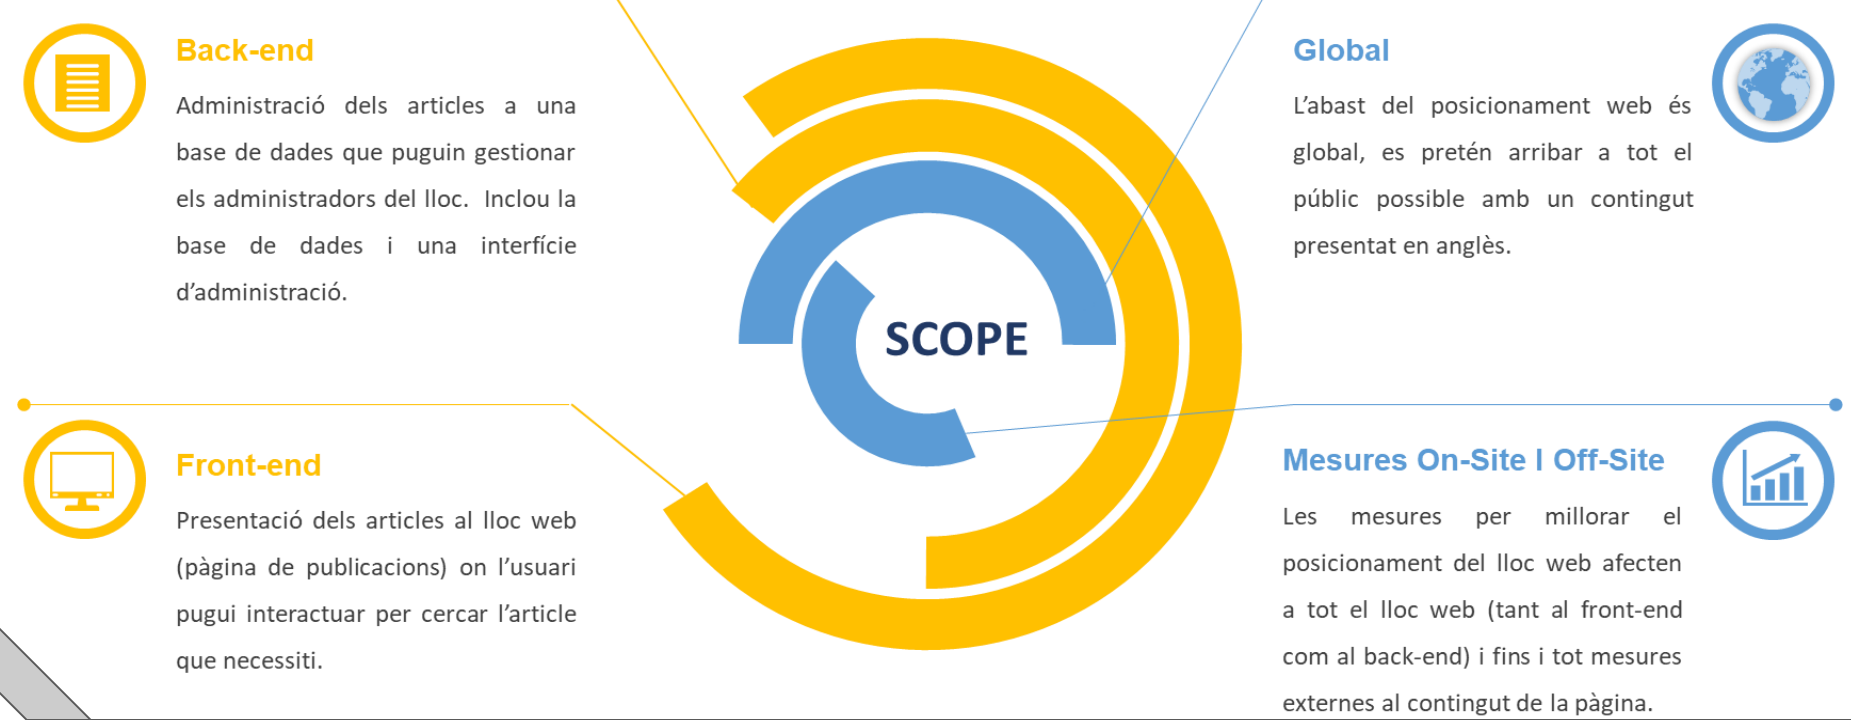


PROPÒSIT

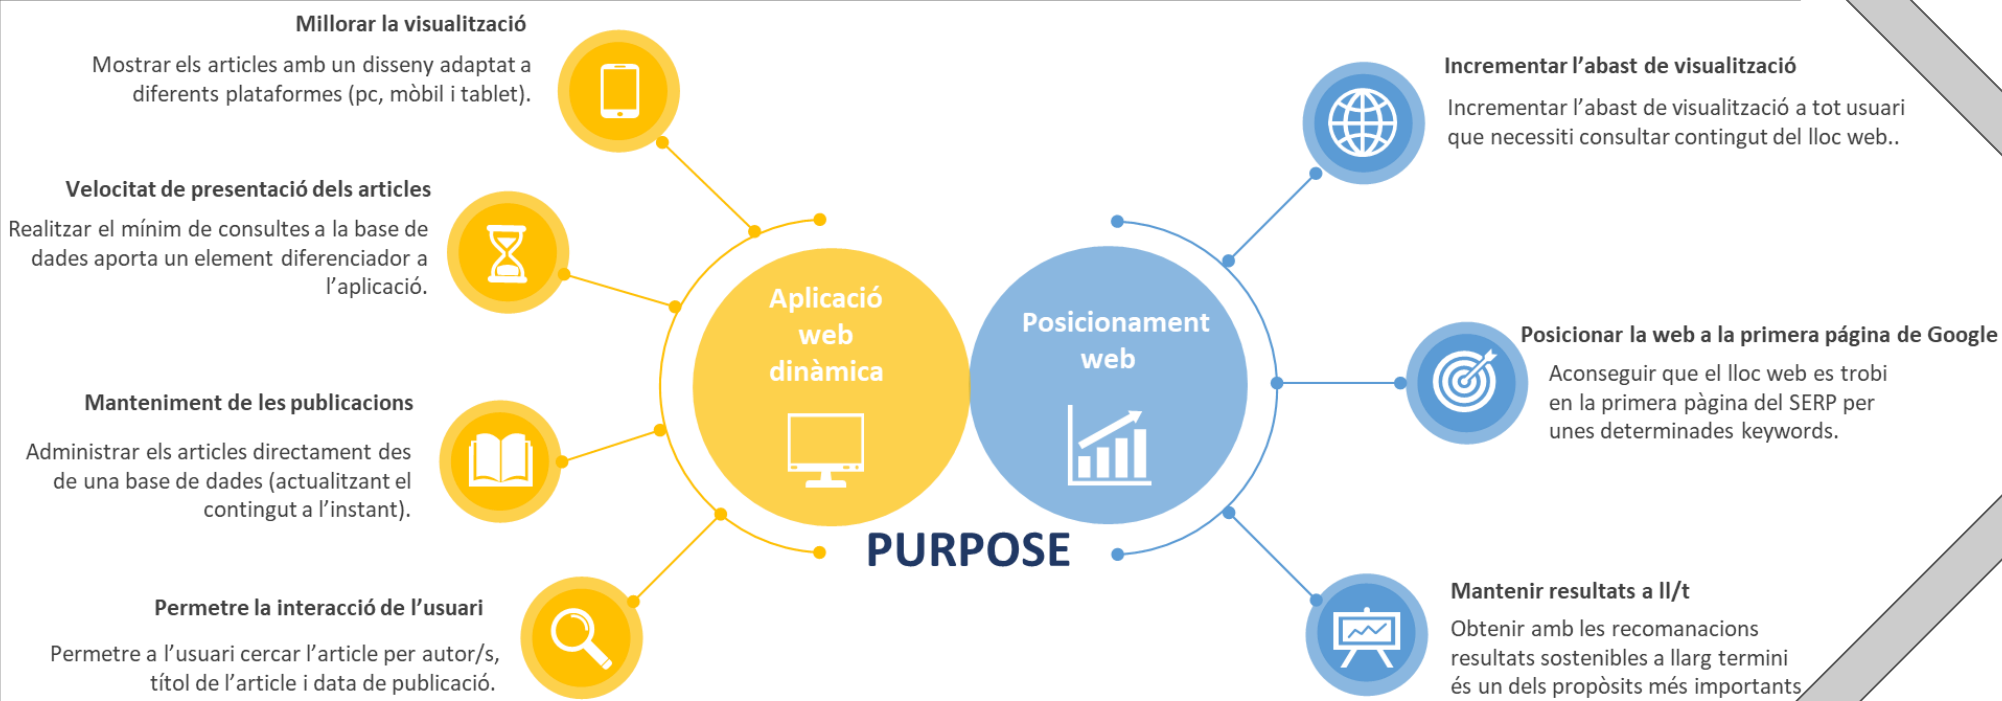

TERMINIS



PLANIFICACIÓ TEMPORAL

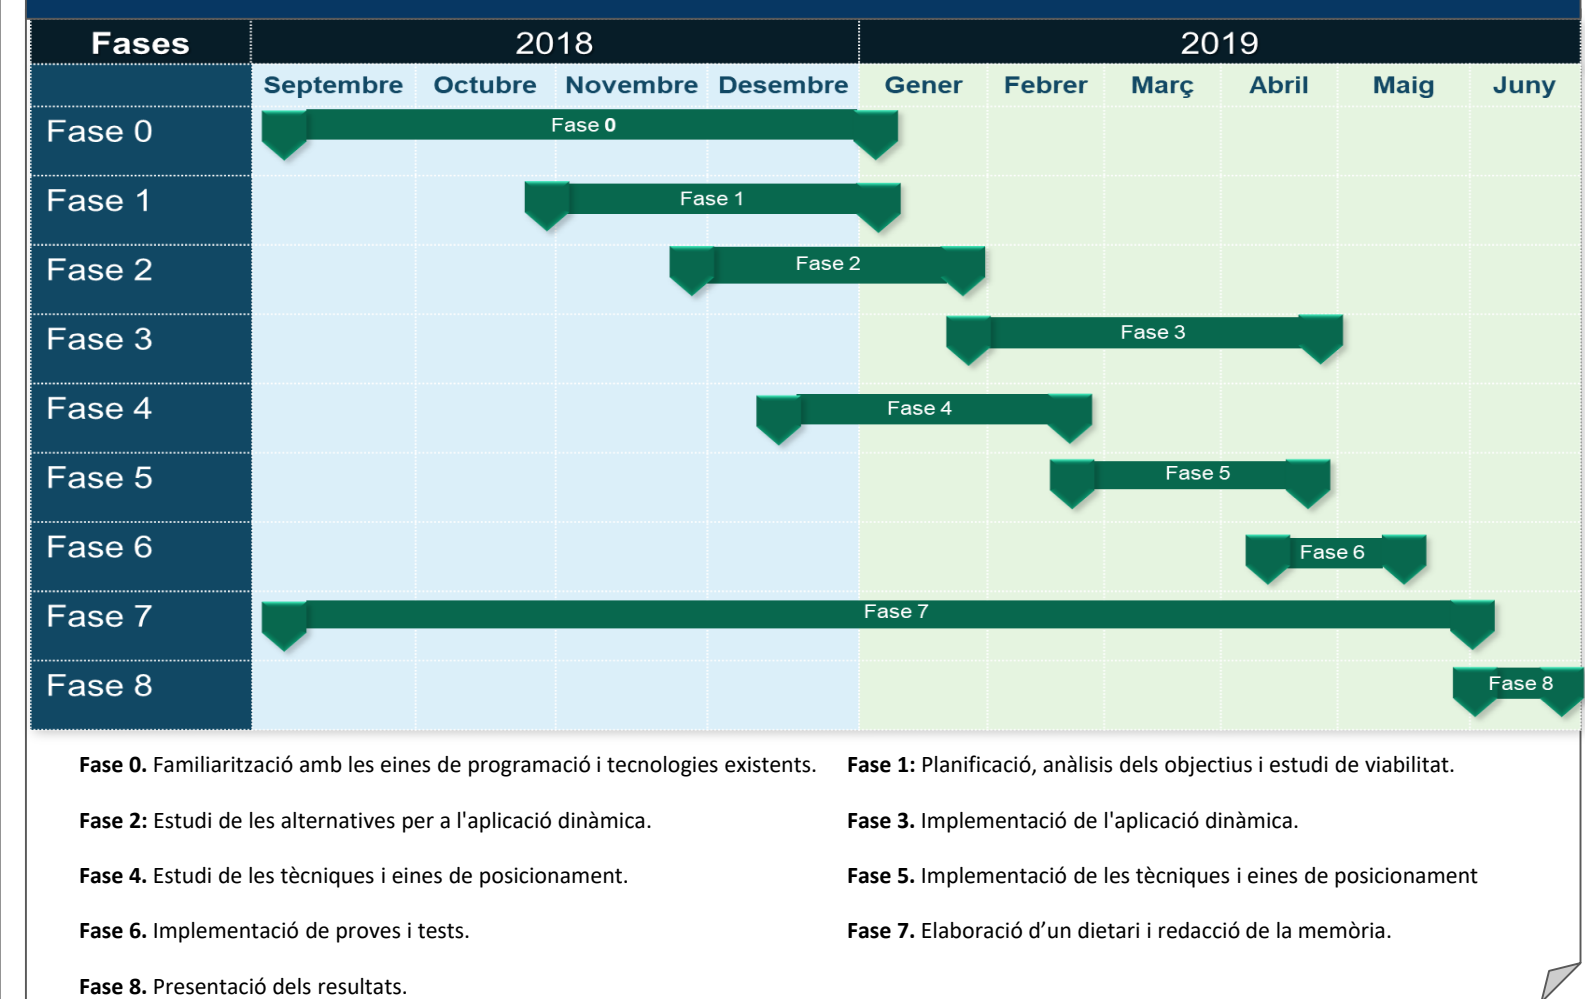

PRESSUPOST

Pressupost del projecte

Líder del projecte: Ismael

Data d'inici: setembre de 2018

Asac budget

% Reserva de Contingència 10%

Pressupost Reserves Total

1.770,00 € 177,00 € 1.947,00 €

Codi Activitat Element Tipus de recurs Unitats Unitats Preu/hora Pressupost

1 Aplicació dinàmica i posicionament SEO 1.770,00 €

1.1 Aplicació dinàmica

Estudi alternatives Anàlisi €/h 20 1.190,00 €

Implementació aplicació Implementació €/h 50 17,00 €

Proves i tests Tests €/h 10 14,00 €

1.2 Posicionament SEO 580,00 €

Estudi alternatives Anàlisi €/h 15 10,00 €

Auditoria SEO Auditoria €/h 10 12,00 €

Millores SEO Recomanacions €/h 15 16,00 €

Proves i tests Tests €/h 5 14,00 €

1.3 Software i domini

Domini .cat Infraestructura €/adquisició 1 A càrrec del client

Eines d'anàlisis SEO Infraestructura €/Mes 1 Inclòs al preu/hora

Eines d'anàlisis de keywords Infraestructura €/Mes 1 Inclòs al preu/hora

Manteniment resultats Manteniment €/Mes 1 Preu anual (150 €/any)


Total d'hores 125

CATALOGACIÓ DE RISCOS I PLA DE MITIGACIÓ/CONTINGENCIA

Id risc	Risc	Id risc	Nivell del risc	Pla de mitigació	Pla de contingència
R1	Complexitat de les tecnologies de programació web.	R1	(3) Baix	Major preparació en la fase 0 del projecte.	Formació intensiva en fonaments de la programació.
R2	Dificultat d'implementació problema plantejat.	R2	(8) Alt	Avançar l'estudi i la implementació del posicionament web.	Augmentar l'horitzó temporal de la fase 5.
R3	Comptabilització del treball autònom amb altres assignatures del curs.	R3	(15) Molt Alt	Dedicar més temps al projecte en les fases centrals (fase 3, 4, 5 i 6), per tal de complir amb els terminis establerts inicialment.	Elaboració d'un dietari per part de l'alumne i supervisió setmanal del tutor.
R4	Tutorització del treball	R4	(6) Mitjà	Establir diferents canals de comunicació entre l'alumne i el tutor.	Reunions presencials o via Skype.
R5	No es compleix l'objectiu del treball	R5	(8) Alt	Centrar esforços a realitzar els objectius del treball amb antelació.	Seguiment del tutor.
R6	No fer correctament la fase de test	R6	(3) Baix	Realitzar una millor previsió de la gestió de la qualitat del projecte.	Seguiment del tutor.
R7	Abandonament del treball	R7	(5) Mitjà	Realitzar una planificació temporal que redueixi la probabilitat d'abandonar el projecte.	Seguiment del tutor.
R8	Falta de compliment amb la planificació	R8	(9) Alt	Reduir i detallar al màxim les funcions a utilitzar.	Seguiment del tutor.

Id risc	Probabilitat	Impacte	Risc	Id risc	Probabilitat	Impacte	Risc
R1	(1) Baixa	(3) Alt	(3) Baix	R1	(1) Baixa	(3) Alt	(3) Baix
R2	(2) Mitjana	(4) Molt Alt	(8) Alt	R2	(1) Baixa	(4) Molt Alt	(4) Baix
R3	(3) Alta	(5) Crític	(15) Molt Alt	R3	(2) Mitjana	(5) Crític	(10) Alt
R4	(1) Baixa	(6) Mitjà	(6) Mitjà	R4	(1) Baixa	(3) Alt	(3) Baix
R5	(2) Mitjana	(4) Molt Alt	(8) Alt	R5	(1) Baixa	(4) Molt Alt	(4) Baix
R6	(1) Baixa	(3) Alt	(3) Baix	R6	(1) Baixa	(3) Alt	(3) Baix
R7	(1) Baixa	(5) Crític	(5) Mitjà	R7	(1) Baixa	(5) Crític	(5) Mitjà
R8	(3) Alta	(3) Alt	(9) Alt	R8	(2) Mitjana	(3) Alt	(6) Mitjà

IMPLEMENTACIÓ

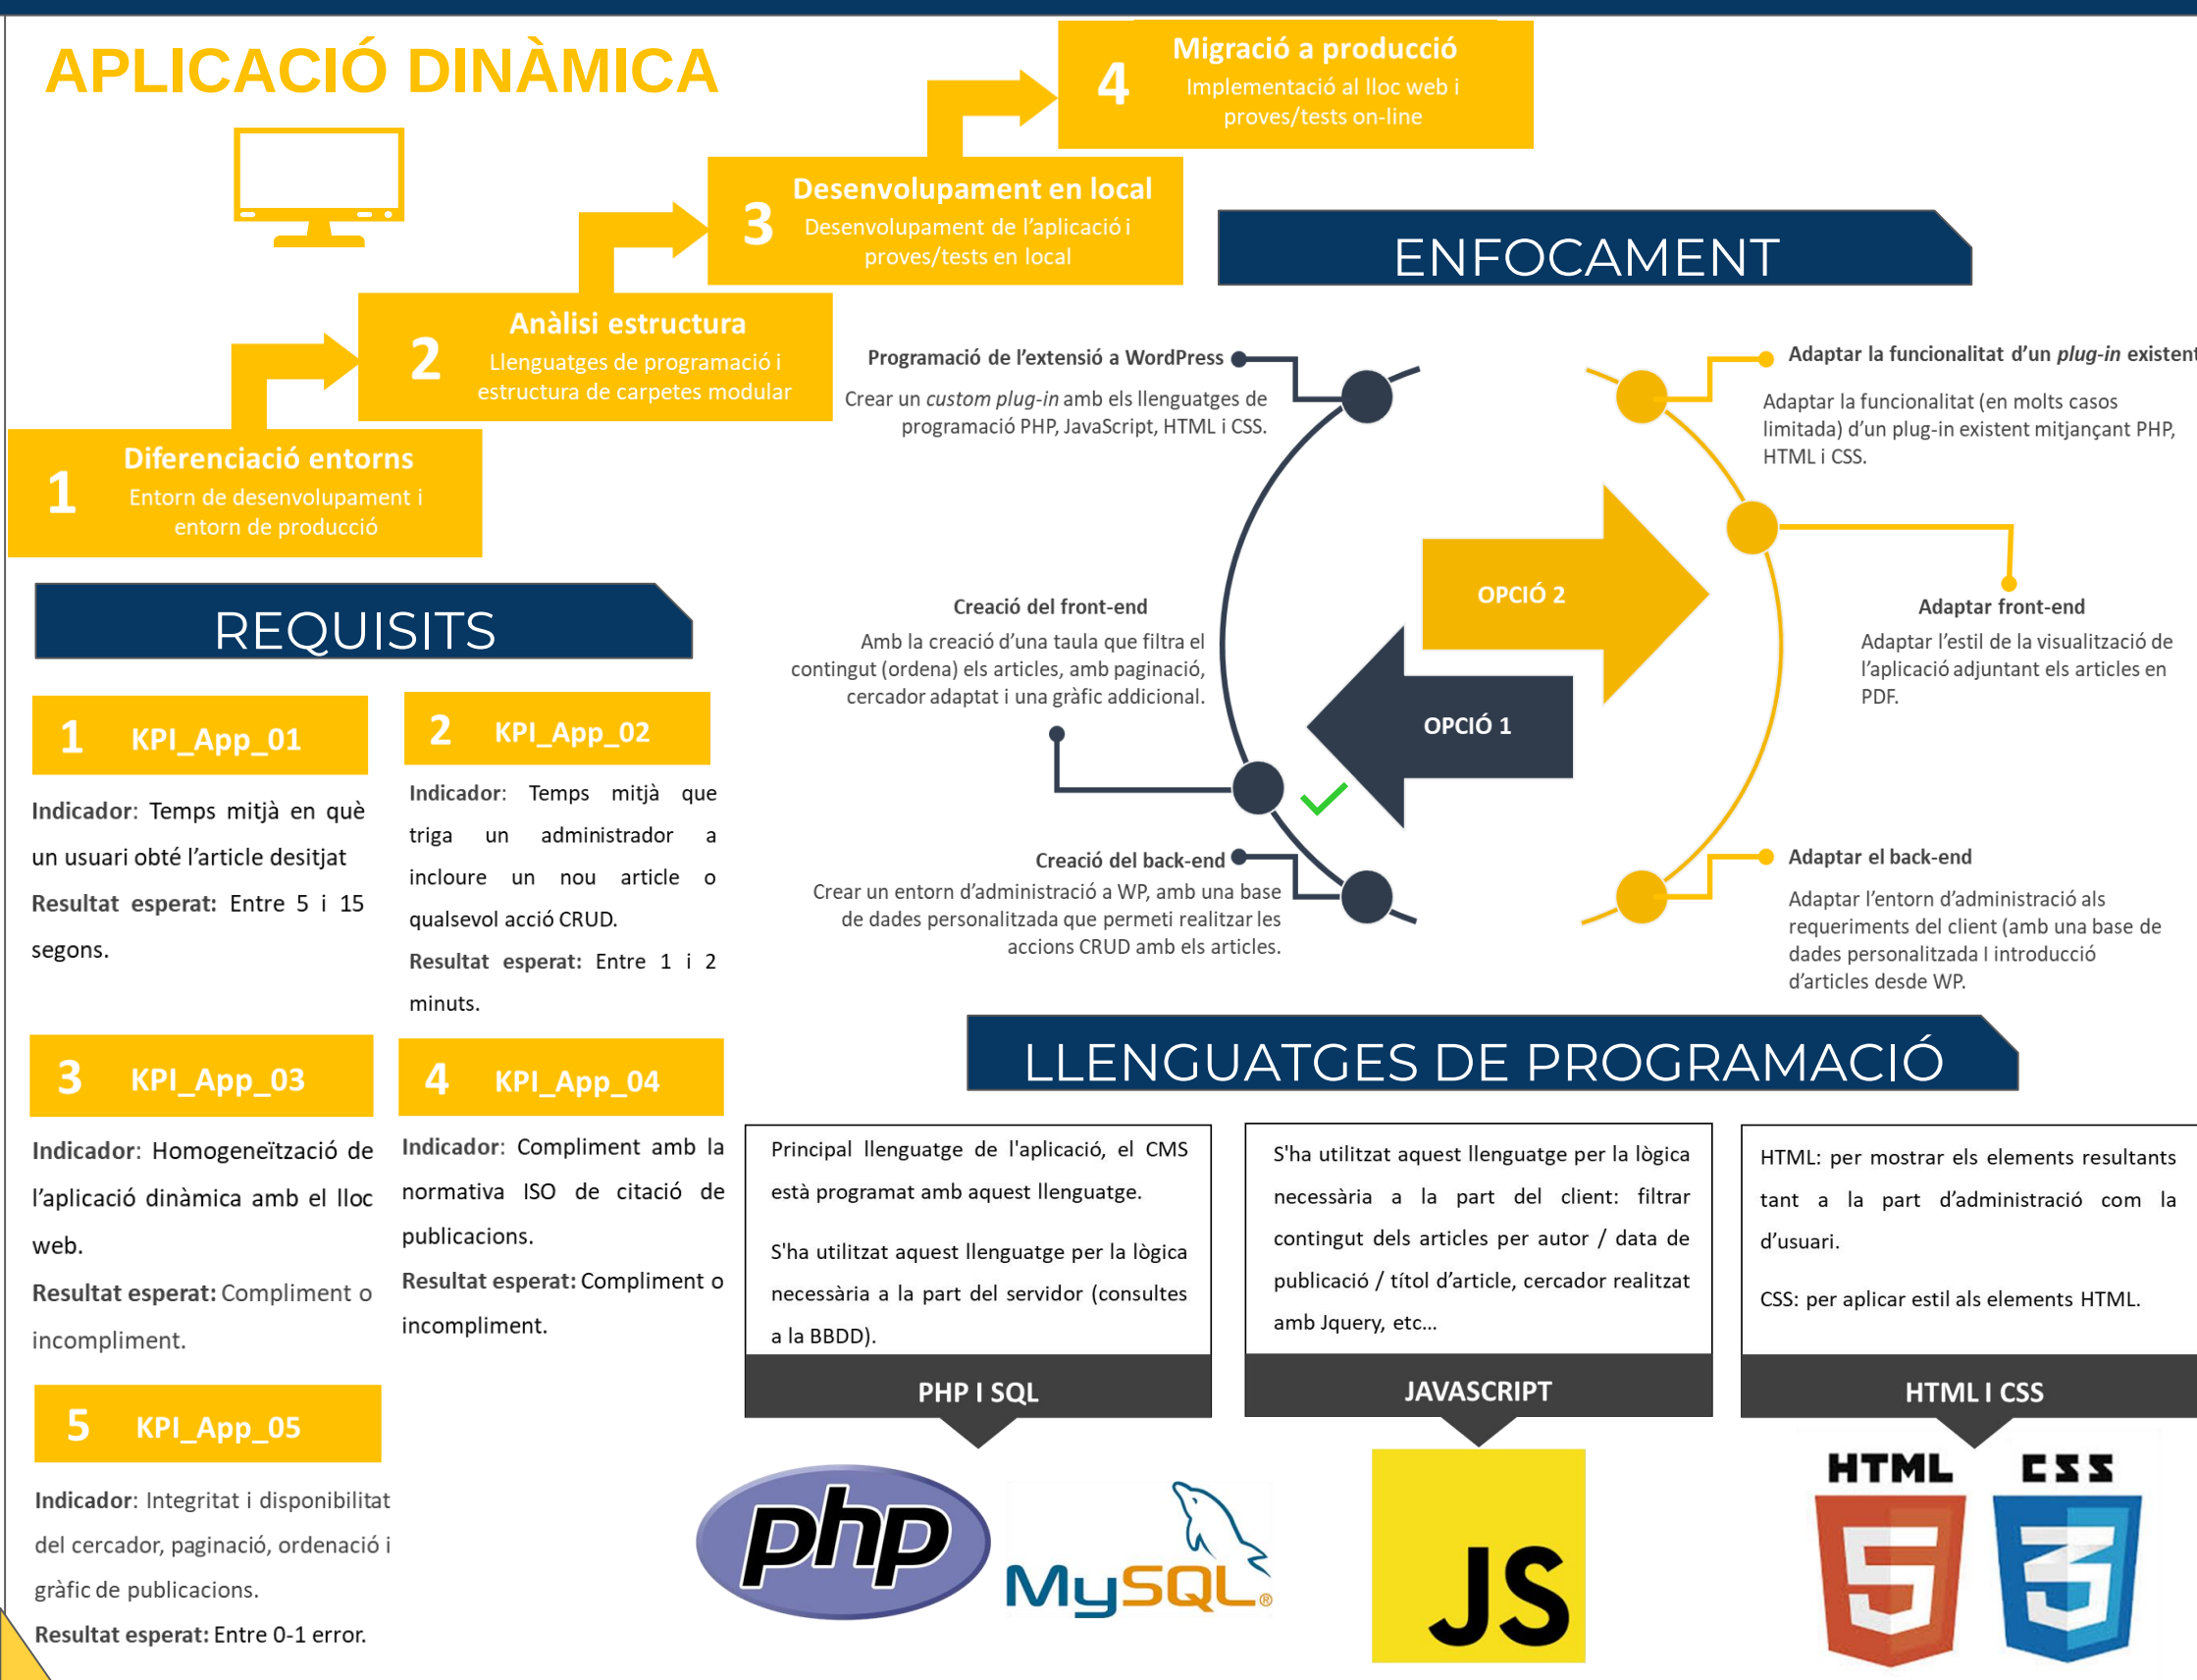

RESULTATS

